




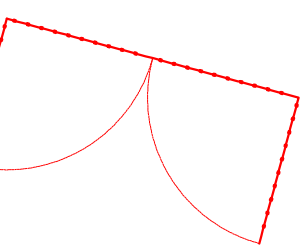


recinzione di cantiere



FASE 1 attività:

FASE 1 attività: allestimento cantiere (recinzione e box) - tracciamento platea - pavimentazione autobloccanti (demolizione pavimentazione e recupero blocchetti) - scavi con escavatore - trasporto materiali da scavi - rinfilanco e rinterro - posa tubazioni elettriche ingresso in platea fondazioni - esecuzione platea fondazione).

Area evidenziate in grigio è disponibili per mezzi d'opera previsti nella fase: prima escavatore, con autocarro per movimentazione terra, poi autobetoniera per getto platea fondazione.

Il materiale prodotto dalla scavo viene direttamente caricato su autocarro per l'invio a discarica autorizzata (vedi Relazione specialistica "Gestione Materie).

In questa fase sono previsti anche gli scavi della parte iniziale delle 2 linee interrato dei feeders (tratto interno all'area di cantiere) e il relativo riempimento dello scavo. Per la cantierizzazione per l'esecuzione delle 2 linee si veda la TAVOLA PSC.4)

Nell'area di cantiere non è consentito l'ingresso di veicoli privati, non di cantiere (è disponibile il parcheggio in Piazza Baratta).

Nell'area di cantiere è localizzata su un'area prima utilizzata come parcheggio aperto a tutti senza limitazioni di tonnellaggio e di dimensioni: l'accesso all'area, quindi, dei mezzi di cantiere può avvenire lungo le vie di transito del parcheggio esistenti.

